Observatorio de contratos menores UPV–UV

Planificación inicial del proyecto

EDT, priorización, estimación y calendario de sprints y ceremonias

Proyecto	Observatorio de contratos menores UPV–UV (Jira: Proyecto GPR)
Incidencia Jira	GPR-22 · Planificación inicial del proyecto (subtareas GPR-23 a GPR-26)
Responsable	Mateo Alís
Equipo	Mateo Alís, Jiale Mao, Manuel Caballero, Pablo Huguet, Vicente Llácer
Versión y fecha	v1.0 · 13/10/2026 (PL4)
Estado	Definitivo

1. Propósito

Este documento recoge el plan base del proyecto acordado al cerrar el Sprint 0 (PL1–PL3). Responde a cuatro preguntas: qué trabajo hay que hacer (EDT), en qué orden de importancia (MoSCoW), cómo se estima el esfuerzo y cuándo se hace cada cosa (calendario de sprints, ceremonias e hitos).


Se complementa con los documentos de alcance (GPR-8), objetivos (GPR-9) y registro de riesgos (GPR-11).

2. Enfoque de planificación

- **Marco:** Scrum adaptado a ciencia de datos (Data Driven Scrum), con sprints alineados con las sesiones de laboratorio.
- **Backlog = EDT:** como se indicó en la PL3, el Product Backlog organizado en épicas hace de Estructura de Desglose del Trabajo.
- **Producto Mínimo Viable desde el Sprint 1:** el primer sprint entrega algo usable de punta a punta (datos unidos y alertas de fraccionamiento) en lugar de solo trabajo preparatorio.
- **Dos sprints de desarrollo:** Sprint 1 · PMV (PL4–PL6) y Sprint 2 · Mejora (PL7–PL9), de tres sesiones cada uno; la PL10 es la presentación.
- **Herramienta:** Jira, proyecto Scrum gestionado por el equipo, con el profesor invitado como viewer.

3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) · GPR-23

Nivel 1: proyecto. Nivel 2: épicas de Jira. Nivel 3: paquetes de trabajo (historias y tareas de Jira). El nivel 4 son las subtareas de Jira, que se definen en el sprint planning y no se dibujan aquí.

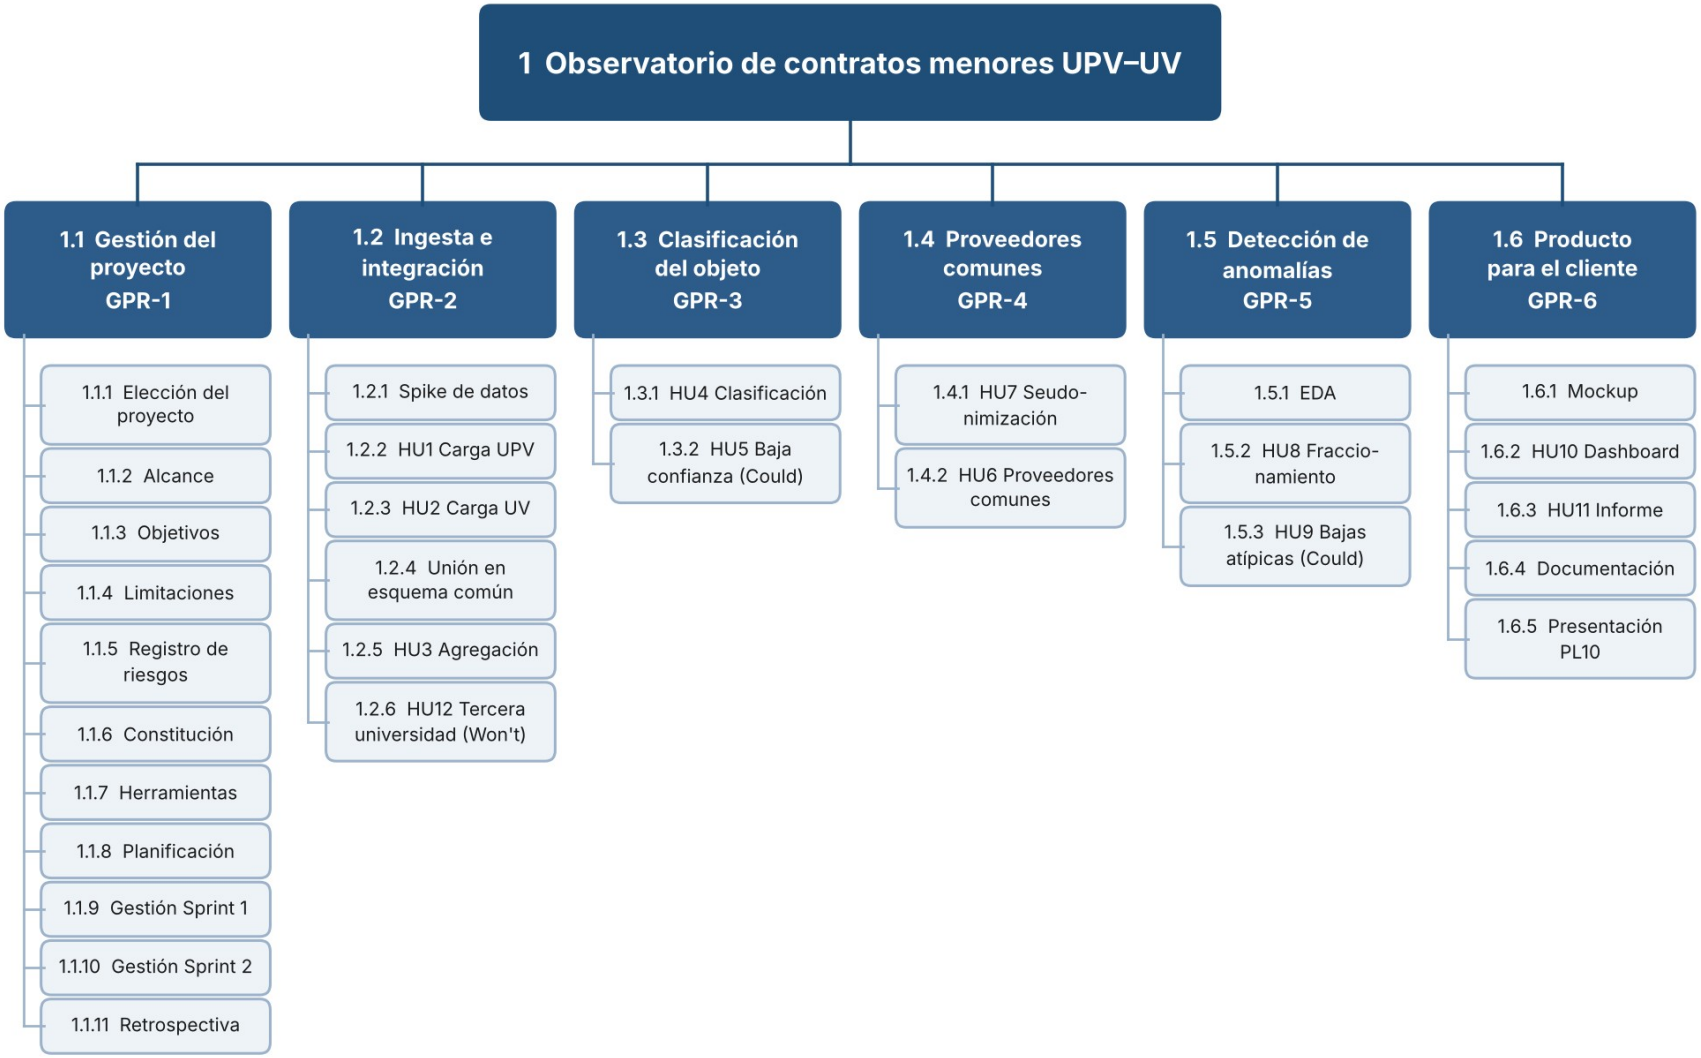

3.1 Diccionario de la EDT

Cada paquete de trabajo corresponde a una incidencia de Jira, donde están su descripción, criterios de aceptación y subtareas. S0, S1 y S2 son el Sprint 0, el Sprint 1 y el Sprint 2.

Código	Jira	Paquete de trabajo	Sprint	Responsable	MoSCoW
1.1.1	GPR-7	Elección del proyecto y de las bases de datos	S0	Vicente	Must
1.1.2	GPR-8	Alcance del proyecto	S0	Mateo	Must
1.1.3	GPR-9	Objetivos del proyecto	S0	Mateo	Must
1.1.4	GPR-10	Limitaciones del proyecto	S0	Manuel	Should
1.1.5	GPR-11	Registro de riesgos	S0	Mateo	Must
1.1.6	GPR-12	Constitución del proyecto	S0	Jiale	Must
1.1.7	GPR-18	Configuración de herramientas	S0	Pablo	Must
1.1.8	GPR-22	Planificación inicial	S0	Mateo	Must
1.1.9	GPR-28	Gestión del Sprint 1	S1	Pablo (SM)	Must
1.1.10	GPR-50	Gestión del Sprint 2	S2	Jiale (SM)	Must
1.1.11	GPR-71	Retrospectiva del proyecto (PL9)	S2	Pablo	Must
1.2.1	GPR-27	Spike: análisis preliminar de los datos	S0	Vicente	Must
1.2.2	GPR-37	HU1 · Carga y limpieza de la UPV	S1	Vicente	Must
1.2.3	GPR-41	HU2 · Carga y limpieza de la UV	S1	Jiale	Must
1.2.4	GPR-34	Unión en un esquema común	S0	Vicente	Must
1.2.5	GPR-45	HU3 · Agregación por expediente	S1	Mateo	Must
1.2.6	GPR-72	HU12 · Tercera universidad	Backlog	—	Won't
1.3.1	GPR-51	HU4 · Clasificación del objeto	S2	Mateo	Must
1.3.2	GPR-55	HU5 · Revisión de baja confianza	Backlog	Mateo	Could
1.4.1	GPR-48	HU7 · Seudonimización	S1	Manuel	Must
1.4.2	GPR-56	HU6 · Proveedores comunes	S2	Manuel	Must
1.5.1	GPR-49	Análisis exploratorio (EDA)	S1	Mateo	Must
1.5.2	GPR-62	HU8 · Detección de fraccionamiento	S1	Pablo	Must
1.5.3	GPR-65	HU9 · Bajas atípicas y concentración	Backlog	Vicente	Could
1.6.1	GPR-60	Mockup del dashboard	S1	Manuel	Must
1.6.2	GPR-66	HU10 · Dashboard con filtros	S2	Jiale	Must
1.6.3	GPR-68	HU11 · Informe de compra conjunta	S2	Vicente	Must
1.6.4	GPR-69	Documentación técnica y manual	S2	Vicente	Should
1.6.5	GPR-70	Presentación final (PL10)	S2	Pablo	Must

Los riesgos R1–R8 (GPR-73 a GPR-78, GPR-121 y GPR-122) cuelgan de la épica de gestión, pero no son paquetes de trabajo: son elementos de seguimiento del registro de riesgos.

4. Priorización MoSCoW · GPR-25

Cada paquete de trabajo tiene una etiqueta MoSCoW en Jira (must, should, could, wont) y su prioridad asociada.

Categoría	Criterio	Paquetes	De ellos, técnicos
Must	Imprescindible para el producto o exigido por la	24	14

Categoría	Criterio	Paquetes	De ellos, técnicos
	asignatura. Sin él, el sprint no cumple su objetivo.		
Should	Importante, pero el producto funciona sin él.	2	1
Could	Deseable si sobra capacidad. Primer candidato a salir si el sprint se complica.	2	2
Won't	Descartado en esta edición, se deja documentado.	1	1

Los paquetes técnicos son los de las épicas 1.2 a 1.6. La proporción de Must en gestión es alta porque las ceremonias, la planificación y la presentación forman parte de lo que se evalúa en la asignatura. En la parte técnica, los Could (HU5 y HU9) actúan como colchón de capacidad y el Won't (HU12) acota el alcance.

Regla de PMV: el Sprint 1 solo incluye paquetes Must, y juntos forman el Producto Mínimo Viable: datos de UPV y UV unidos y primera lista de alertas de fraccionamiento.

5. Estimación del esfuerzo · GPR-24

La estimación sigue lo planteado en las sesiones de laboratorio:

- **Sprint 1 (PL4):** sin estimación en story points. El trabajo se dimensiona descomponiendo cada historia en subtareas con una estimación orientativa en horas.
- **Sprint 2 (PL7):** las historias se estiman en story points con planning poker, usando la sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), y el resultado se registra en el campo Story point estimate de Jira.

5.1 Reglas del planning poker

- Se presenta la historia y se aclaran dudas sobre su alcance y criterios de aceptación.
- Cada persona elige una carta en secreto y todas se muestran a la vez.
- Hay consenso si todas las cartas están a distancia de 1 entre sí en la serie.
- Si no, quienes votaron los extremos explican su razonamiento y se vuelve a votar hasta llegar a consenso.
- Herramienta: PlanningPokerOnline o Scrumpoker Online, integrables con Jira.

La velocidad obtenida en el Sprint 2 y la comparación entre lo estimado y lo real se analizan en la retrospectiva del proyecto (GPR-71).

6. Calendario de sprints y ceremonias · GPR-26

Las sesiones de laboratorio son los martes a las 19:00. Además, el equipo celebra una reunión de control semanal los lunes a las 20:00, que hace de seguimiento (scrum semanal).

Sesión	Fecha	Sprint	Ceremonias e hitos
PL1	22/09	Sprint 0	Arranque de las prácticas, formación del equipo y principios ágiles.
PL2	29/09	Sprint 0	Selección del proyecto y de los datos; creación del proyecto en Jira.
PL3	06/10	Sprint 0	Propuesta inicial de backlog (EDT) y priorización.
PL4	13/10	Sprint 1	Cierre del Sprint 0. Sprint planning del Sprint 1: Sprint Goal, selección de historias, subtareas y asignación. Inicio del sprint.
PL5	20/10	Sprint 1	Trabajo de desarrollo y seguimiento del sprint.
PL6	27/10	Sprint 1	Sprint review con demo del PMV al Product Owner. Retrospectiva del Sprint 1. Revisión del backlog. Cierre del sprint.
PL7	03/11	Sprint 2	Sprint planning del Sprint 2 con estimación por planning poker. Inicio del sprint.

Sesión	Fecha	Sprint	Ceremonias e hitos
PL8	10/11	Sprint 2	Trabajo de desarrollo y seguimiento del sprint.
PL9	17/11	Sprint 2	Sprint review. Retrospectiva de todo el proyecto. Cierre del sprint.
PL10	24/11	—	Presentación final del proyecto (10 minutos).

Entre la PL6 y la PL7 (28/10–02/11) no hay sprint activo: esa semana se usa para refinar el backlog con el feedback de la review.

6.1 Sprints

Sprint	Fechas	Sprint Goal
Sprint 0 · Definición	02/10 – 13/10	Proyecto definido: tema y datos elegidos, alcance, objetivos, limitaciones y riesgos, herramientas montadas y backlog inicial priorizado.
Sprint 1 · PMV	13/10 – 27/10	Contratos de UPV y UV cargados en un esquema común y primera lista de alertas de posible fraccionamiento, presentada al PO en la review de la PL6.
Sprint 2 · Mejora	03/11 – 17/11	Clasificación del objeto, proveedores comunes, dashboard con filtros e informe de compra conjunta; retrospectiva del proyecto lista para la PL10.

6.2 Hitos

Hito	Fecha	Criterio de cumplimiento
H0	13/10	Sprint 0 cerrado: proyecto definido y backlog priorizado en Jira.
H1	27/10	PMV presentado al Product Owner y su feedback registrado.
H2	03/11	Sprint 2 planificado y todas sus historias estimadas con planning poker.
H3	17/11	Producto completo (dashboard e informe) y retrospectiva del proyecto hecha.
H4	24/11	Presentación final realizada en el tiempo asignado.

7. Roles y reparto del trabajo

El rol de Scrum Master rota por sprint. El reparto de cada sprint se confirma o ajusta en su sprint planning.

Miembro	Sprint 1 · PMV	Sprint 2 · Mejora
Pablo Huguet	Scrum Master (GPR-28) · HU8 fraccionamiento	Retrospectiva del proyecto (GPR-71) · Presentación (GPR-70)
Jiale Mao	HU2 carga de la UV	Scrum Master (GPR-50) · HU10 dashboard
Vicente Llácer	HU1 carga de la UPV	HU11 informe · Documentación
Manuel Caballero	HU7 seudonimización · Mockup	HU6 proveedores comunes
Mateo Alís	HU3 agregación · EDA	HU4 clasificación del objeto
